

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN TUNNELIER DES CADEREAUX D'UZÈS ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : MARS 2024

CONTACTS



Entreprises
Samir RENAI
06 80 75 31 62




Maîtrise d'ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71



PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre, l'Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d'Uzès et des Limites, sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l'est de la ville.

PRESENTATION GENERALE

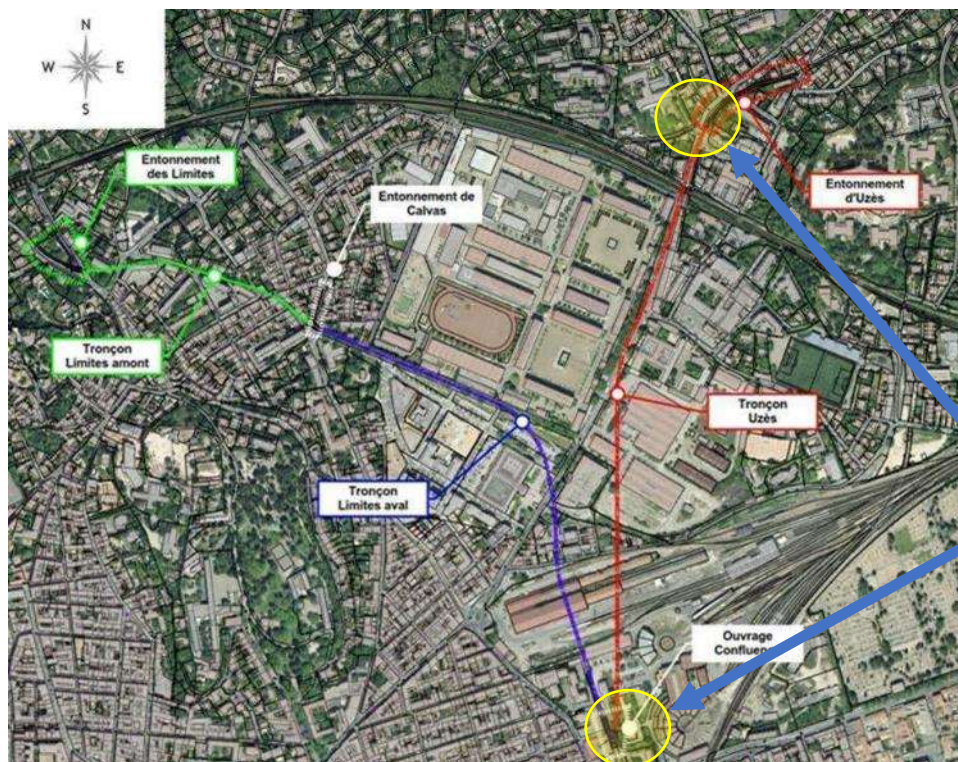

Travaux en cours
2023-2026 :
Tronçons des
cadereau d'Uzès et
Limites aval en
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de
travaux

MARS 2024 : Travaux sur plateforme et cadereaux

Travaux préparatoires :

- Aménagement de chantier en cours
- Fin de terrassement et aménagement du mur de soutènement pour permettre la réalisation du puits d'entrée du tunnelier



Photo du 02/03/2024



Photo du 22/03/2024

Poursuite des aménagements de plateforme:

- Fin de préparations des bacs à déblais (stockage tampon des déblais issus du creusement avant amenée en décharge)
- Aménagement général de plateforme



Photos du 26/03/2024



FEVRIER - MARS 2024: Réalisation des pieux

Soutènement par pieux en béton ferrillé : Pieux qui serviront de paroi au puits d'entrée du tunnelier

- Fin de réalisation : 06 mars 2024



Photo du 05/03/2024
Atelier pieux : derniers
pieux



Photo du 07/03/2024
Départ Atelier pieux

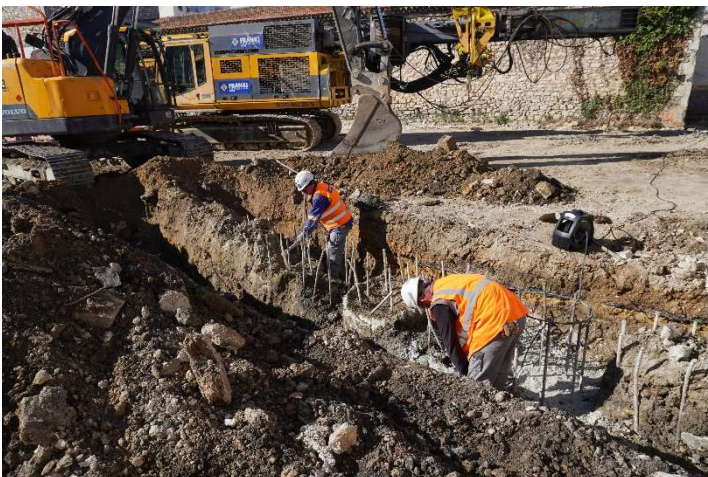


Photo du 08/03/2024 et 16/03/2024
Réalisation de la poutre de couronnement

AVRIL 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Avril 2024:

- Terrassement du puits
- Poursuite des installations de chantier : bétonnage de la plateforme
- Terrassement des bacs à déblais du tunnelier
- Raccordement Enedis au chantier 20 000 V

Plan général d'installation sur le site Confluence / Rue Pierre Semard

Avril 2024

