

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN TUNNELIER DES CADEREAUX D'UZÈS ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER : Octobre 2023

CONTACTS



Entreprises
Samir RENAI
06 80 75 31 62




Maîtrise d'ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71



PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre, l'Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d'Uzès et des Limites, sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l'est de la ville.

PRESENTATION GENERALE

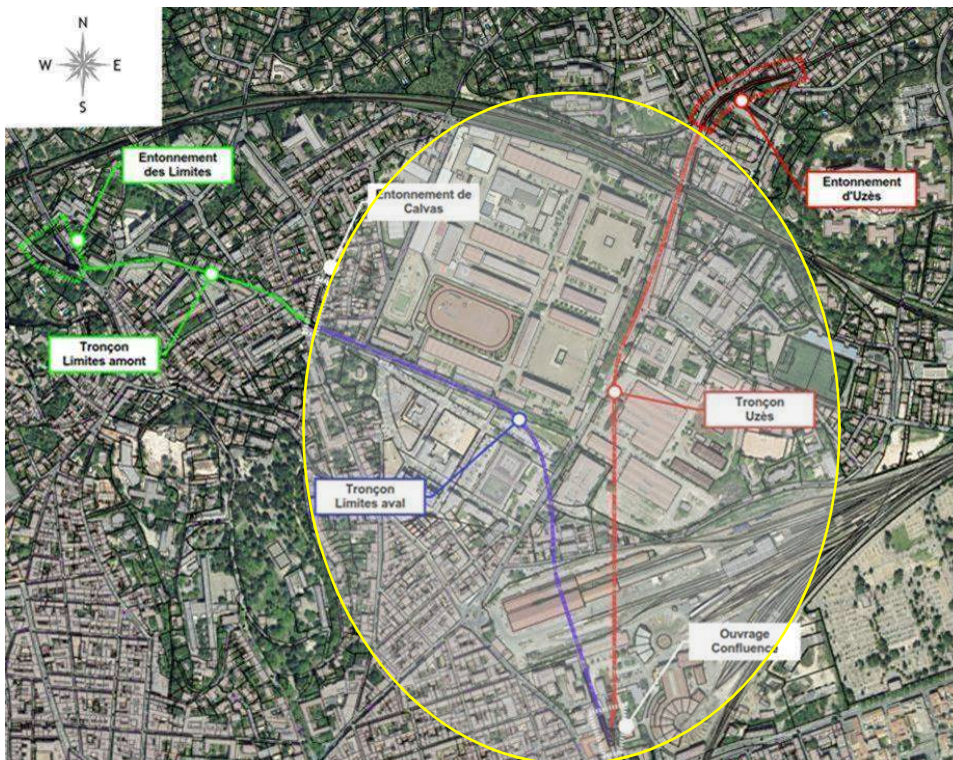

Travaux en cours
2023-2026 :
Tronçons des
cadereau d'Uzès et
Limites aval en
tunnelier (Ø 3,3 m)

Travaux prévisionnels:

2025 : Entonnement
d'Uzès

2026 : Tronçon Limites
amont (micro-tunnelier)

2027 : Entonnement
Limites et Calvas

Octobre 2023 : PREPARATION DE CHANTIER

Installation de la base chantier sur les terrains à côté de la station service / Travaux préparatoires :

- Sondage de reconnaissance par forage
- Reconnaissance des réseaux



Photo du 04/10/2023



Photo du 13/10/2023

Réalisation de l'accès à la base chantier depuis la rue Pierre Semard:

- Création d'accès poids lourd sur voirie
- Démolition de l'enceinte existante pour création d'un portail



Photo du 23/10/2023



Photo du 23/10/2023

NOVEMBRE – DECEMBRE 2023 : INSTALLATION ET DEMARRAGE

Réalisation des soutènements :

- Fin de création de l'accès par la Rue Pierre Semard (pas de modification du carrefour)
- Installation de la base vie de chantier sur les terrains à côté de la station service

Plan d'aménagement du carrefour Pierre Semard

