

# TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ENTONNEMENT DU CADEREAU D'UZÈS EN ZONE URBAINE DENSE

**INFOS CHANTIER route d'Uzès : Avril 2025**

## CONTACTS



**Entreprises**  
Emmanuelle BRAUN  
06 43 20 78 56




**Maîtrise d'ouvrage**  
Jordane Lafaye  
04 66 02 55 71



## PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre, l'Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d'Uzès et des Limites, sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l'est de la ville.

## PRESENTATION GENERALE

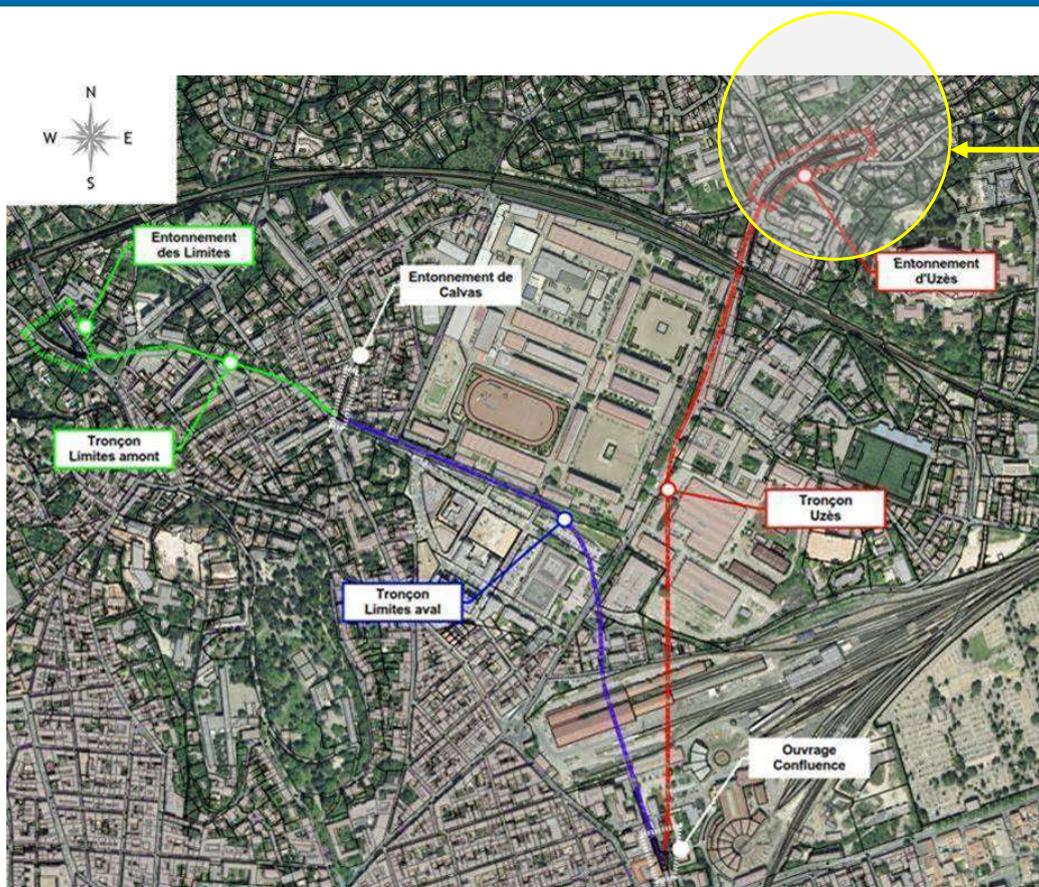

Zone de travaux :  
Entonnement d'Uzès

Autres travaux en cours  
jusqu'en 2026:

Ouvrage confluence  
Tronçon Uzès  
Tronçon Limites aval  
Tronçon Limites amont

2026-2027 :  
Entonnement Limites et  
Calvas

**Avril 2025**


**PRESENTATION GENERALE**

**Travaux entre le puits de sortie du tunnelier (rue cité Paul Giran) et la rue du jeu de boules**

- Fermeture de la rue Van Dyck à l'intersection de la route d'Uzès ;
- Mise à double sens de la rue Van Dyck entre la rue du jeu de boules et le chantier, avec conservation des accès véhicules aux propriétés ;
- Fermeture du parking sur la route d'Uzès avec conservation de l'accès véhicule privé ;

**Travaux en cours 2025 :  
Entonnement du  
Cadereau d'Uzès**

**Puits de sortie  
du tunnelier**

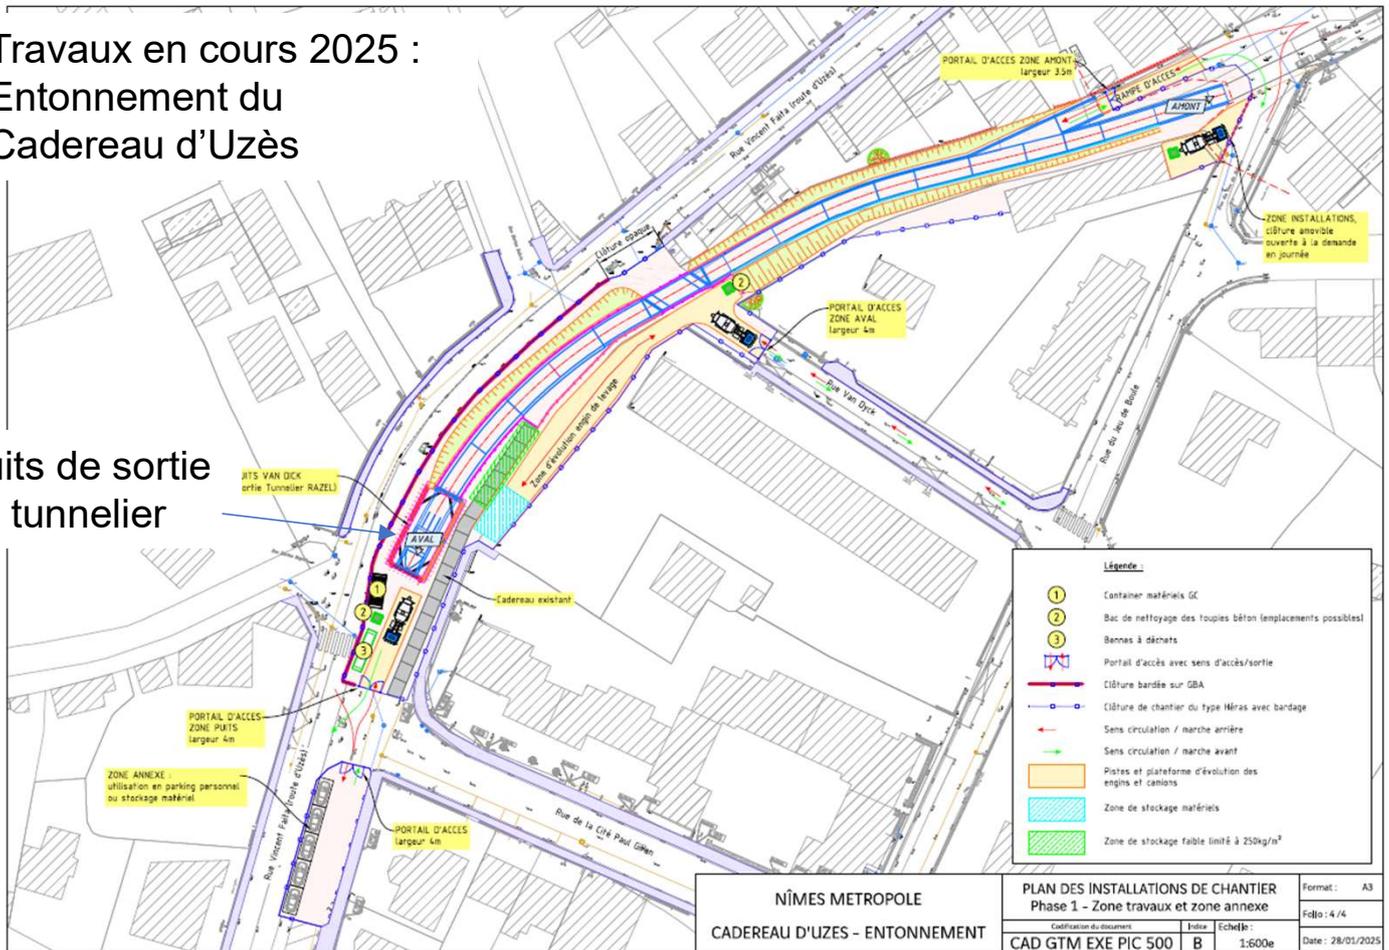


# Avril 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil

## Travaux prévus au mois d'avril par zones :


Zone du puits de sortie du tunnelier (côté rue cité Paul Giran) :

- Travaux de Génie Civil dans le puits
- Réalisation du radier (sol de l'ouvrage)
- Réalisation des voiles de comblement (parois de l'ouvrage)
- Réalisation de la zone d'entonnement entre le cadereau à ciel ouvert et le tunnel (jonction entre le puits de sortie du tunnelier et l'ouvrage à réaliser)

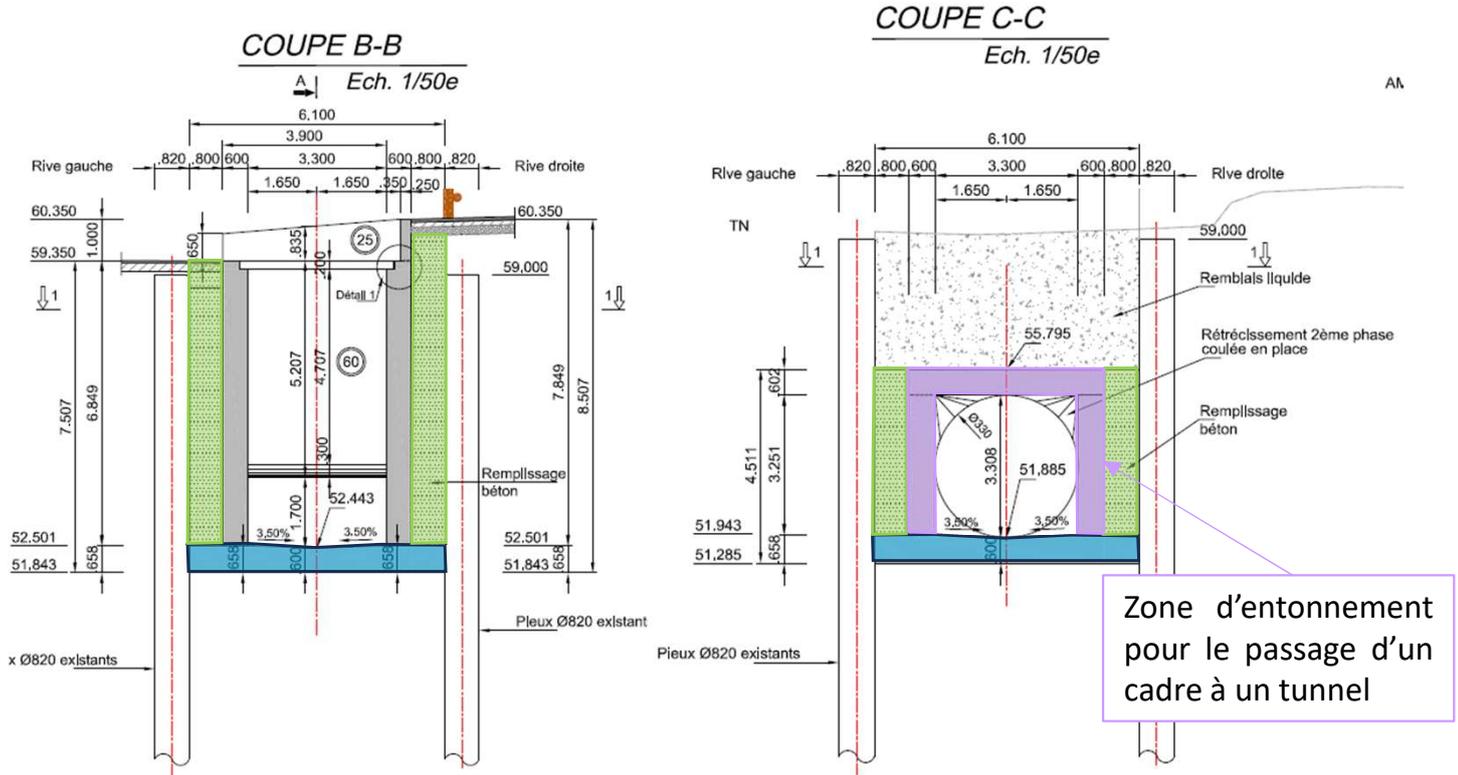

Zone Aval (entre le puits et le pont rue Van Dyck) :

- Paroi berlinoise (soutènements des terrains)
- Forage et scellement des profilés métalliques pour la réalisation de la paroi berlinoise

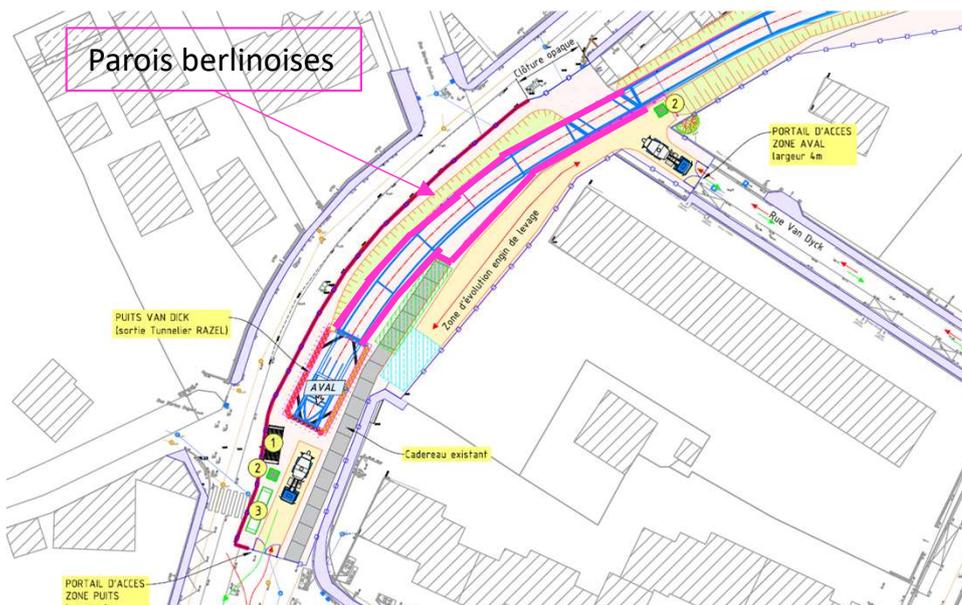

## Avril 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil



Outil de forage des profilés pour la paroi berlinoise

Zone Amont (entre la rue Van Dyck et la rue du jeu de boules) :

- Réalisation d'une paroi micro-berloise (soutènements)
- Démarrage des terrassements de la zone amont
- Démarrage du Génie Civil de l'ouvrage à l'amont

## Mai 2025 : Continuité des travaux

**Travaux pour mai 2025 :**

- Suite du terrassement et ouvrages en Génie Civil dans la zone amont (Nord de la rue Van Dyck)
- Suite des travaux de Génie Civil dans le puits Van Dyck
- Terrassement et réalisation du béton projeté entre les profilés en zone aval (finalisation des soutènements de terrains)
