

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ENTONNEMENT DU CADEREAU D'UZÈS EN ZONE URBAINE DENSE

INFOS CHANTIER route d'Uzès : Juin 2025

CONTACTS



Entreprises
Emmanuelle BRAUN
06 43 20 78 56




Maîtrise d'ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71



PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre, l'Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d'Uzès et des Limites, sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l'est de la ville.

PRESENTATION GENERALE

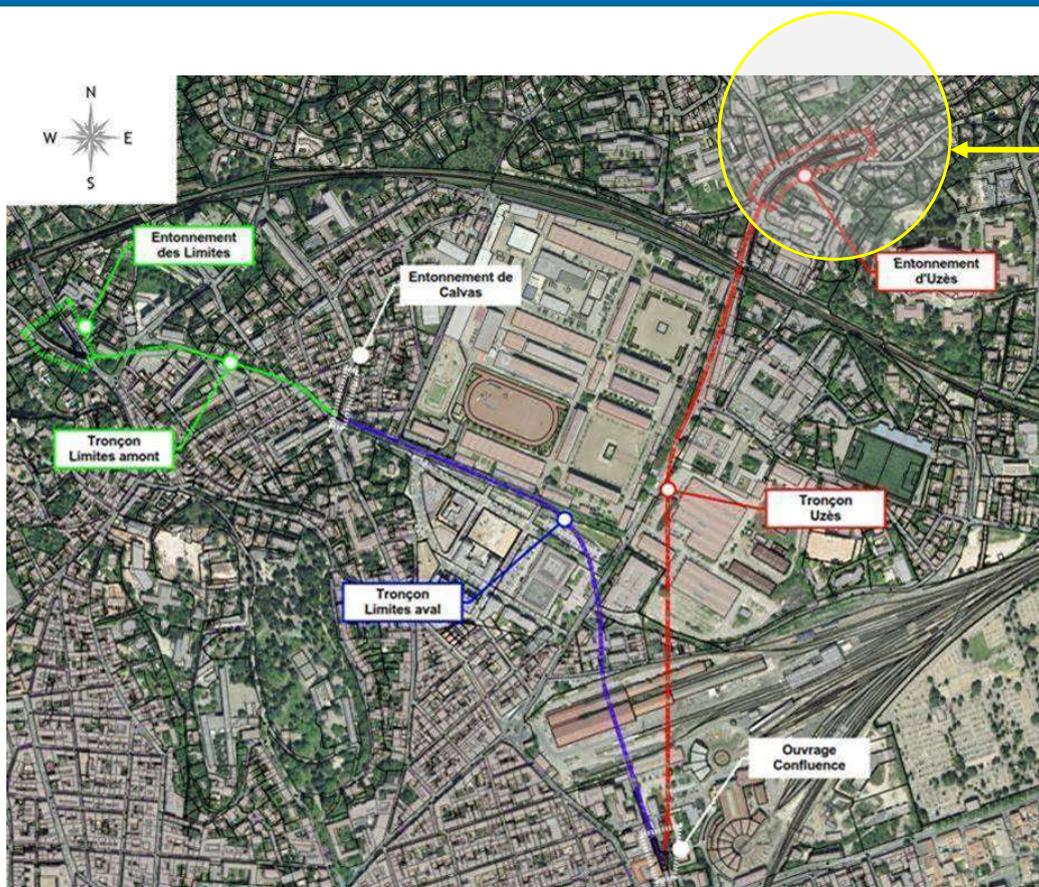

Zone de travaux :
Entonnement d'Uzès

Autres travaux en cours jusqu'en 2026:

Ouvrage confluence
Tronçon Uzès
Tronçon Limites aval
Tronçon Limites amont

2026-2027 :
Entonnement Limites et Calvas

Juin 2025


PRESENTATION GENERALE

Travaux entre le puits de sortie du tunnelier (rue cité Paul Giran) et la rue du jeu de boules

- Fermeture de la rue Van Dyck à l'intersection de la route d'Uzès ;
- Mise à double sens de la rue Van Dyck entre la rue du jeu de boules et le chantier, avec conservation des accès véhicules aux propriétés ;
- Fermeture du parking sur la route d'Uzès avec conservation de l'accès véhicule privé ;

Travaux en cours 2025 :
Entonnement du
Cadereau d'Uzès

Puits de sortie
du tunnelier

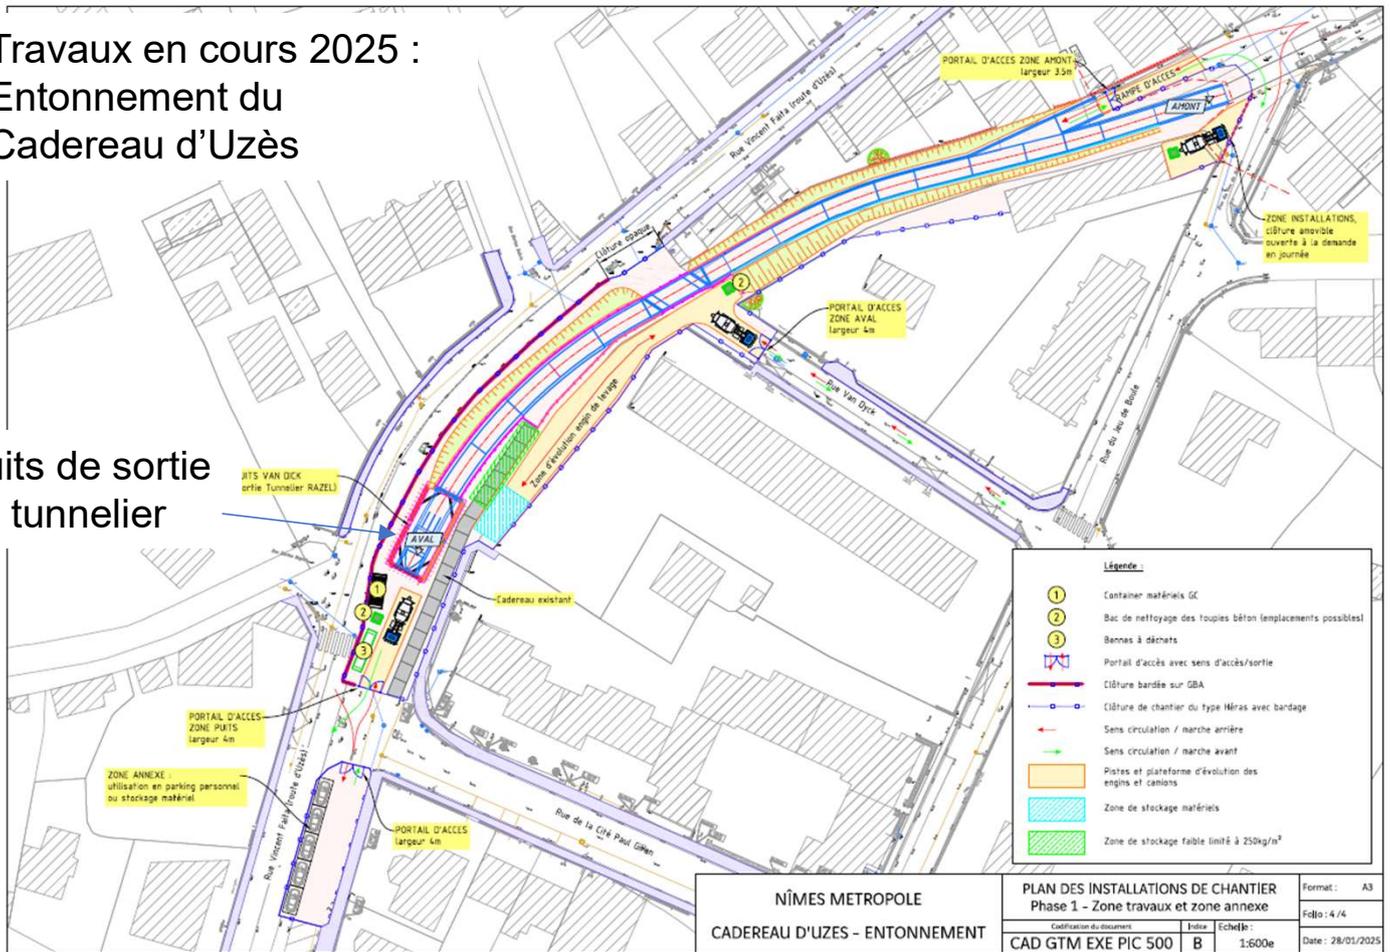


Juin 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil

Travaux prévus au mois de juin par zones :

Zone du puits de sortie du tunnelier (côté rue cité Paul Giran) :

- Travaux de Génie Civil dans le puits

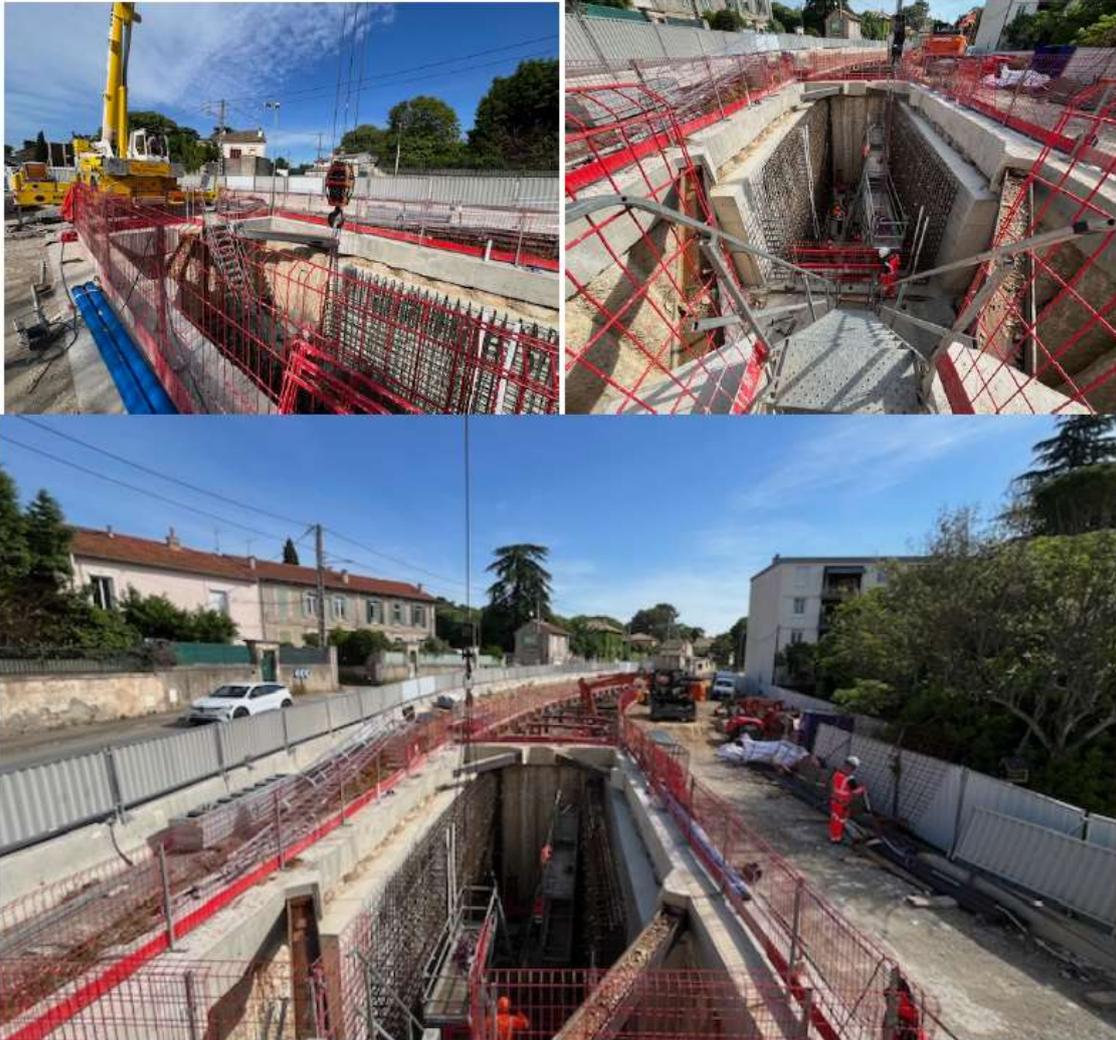

Zone Aval (entre le puits et le pont rue Van Dyck) :

- Terrassement et béton projeté entre les profilés (soutènement)



Juin 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil

Zone Amont (entre la rue Van Dyck et la rue du jeu de boules) :

- Forage et scellement des profilés métalliques pour la réalisation de la paroi berlinoise
- Démarrage des terrassements de la zone amont
- Démarrage du Génie Civil de l'ouvrage à l'amont



Outil de forage des profilés pour la paroi berlinoise

Juillet 2025 : Continuité des travaux

Travaux pour juillet 2025 :

- Suite du terrassement et ouvrages en Génie Civil dans la zone amont (Nord de la rue Van Dyck)
- Suite des travaux de Génie Civil dans le puits Van Dyck
- Réalisation du Génie Civil dans la zone Aval
